



ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şubat 2016
Adana

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
www.adanabtu.edu.tr
ADANA
Şubat 2016

İçindekiler

A- GENEL DEĞERLENDİRME	5
a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	5
b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	5
c- 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme.....	8
d- 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	10
B- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	12
a- Devam Eden Projeler	12
b- Tamamlanan Projeler	20
C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ	24
D- EKLER	1

A- GENEL DEĞERLENDİRME

a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan “**Özel Bütçeli**” bir kurumdur.

b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz, yerleşke arazisi tahsisinin 2014 yılı sonunda gerçekleşmesi sonucunda ihale edilen 1. etap binaların inşaatı ve altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış bulunan mevcut üç farklı bina ile hizmet vermeye devam etmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki gibidir.

YERLEŞKE ADI	TOPLAM ALAN (M ²)	AÇIKLAMA
Yeşiloba Yerleşkesi	9.006	Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır.
Kurttepe Yerleşkesi	2.878	Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır.
Ziyapaşa Yerleşkesi	2.910	Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır.
TOPLAM	14.794	

Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayı verileri ise aşağıdaki şekildedir.

YERLEŞKE ADI	DERSLİK SAYISI	LABORATUVAR SAYISI	BİLGİSAYAR LABORATUVAR SAYISI	KÜTÜPHANE SAYISI
Yeşiloba Yerleşkesi	7	9	1	1
Kurttepe Yerleşkesi	21	-	1	1
Ziyapaşa Yerleşkesi	10	-	1	1
TOPLAM	38	9	3	3

Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde **1.431.712 m²'lik arazinin kampüs alanı olarak; 40.000 m²'lik arazinin ise yurt alanı** olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleşmiştir.

Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir.



Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü



Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı

Üniversitemize 1.700 Akademik ve 489 İdari olmak üzere toplam 2.189 kadro tahsis edilmiştir.

Üniversitemizde 2015 yılı itibariyle görev yapan akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

UNVANI	PERSONEL SAYISI
PROFESÖR	2
DOÇENT	7
YARDIMCI DOÇENT	51
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	3
OKUTMAN	15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	50
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖYP Kapsamında Çeşitli Üniversitelerde Öğrenim Gören)	65
UZMAN	11
TOPLAM	204

Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan

personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

İSTİHDAM TÜRÜ	PERSONEL SAYISI
İDARİ PERSONEL	161
657 SAYILI KANUNUN 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34
DAİMİ İŞÇİ	7
TOPLAM	202

Üniversitemizde İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisans ve yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere göre öğrencilerin 2015 yılı itibariyle sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir.

FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI	HAZIRLIK SINIFI	LİSANS	LİSANS (UOLP)	YÜKSEK LİSANS	TEZSİZ YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	TOPLAM
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	182	218	13				413
İŞLETME FAKÜLTESİ	66	69	8				143
TURİZM FAKÜLTESİ	31	16					47
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	21						21
FAKÜLTELER TOPLAMI	300	303	21	0	0	0	624
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ				67	62		129
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ				52	123		175
ENSTİTÜLER TOPLAMI	0	0	0	119	185	0	304
GENEL TOPLAM	300	303	21	119	185	0	928

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin 2015 yılı itibariyle mezun öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI	YÜKSEK LİSANS	TEZSİZ YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	1	108	109
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	1	98	99
ENSTİTÜLER TOPLAMI	2	206	208

c- 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam yedi adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, laboratuvar malzemeleri alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç duyulan etüt projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Belirlenen hedefler çerçevesinde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı projesi kapsamında; ihalesi birlikte gerçekleştirilen “Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi” 2015 yılında yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılında toplamda 31.354.755 TL (26.571.826 TL + KDV) harcama yapılarak 2015 yılı mevcut revize ödeneğine göre %73,95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İhalesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL olup, gerçekleşen fiziki imalat yaklaşık %36’dır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında; ilk etapta 6.500 m² Spor Salonu, 1 Basketbol, Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu ve müstemilat olarak planlanmış ancak yapımına başlanan binalar ile eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam ettiği için 2015 yılı içinde bir harcama gerçekleşmemiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ise; 2.827 m² bina inşaatı ve makine-teçhizat alımı olmak üzere iki alt projeyi kapsamakta olup, inşaat alt projesinde yapımına başlanan binalar ile eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam ettiği için 2015 yılı içinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Diğer alt proje makine teçhizat kaleminde ise laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış ve mevcut revize ödeneğin % 37,21’i kullanılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi ise; büyük onarımlar, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, makine teçhizat alımı vb. alımları kapsamakta olup, proje bazında Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut 4.703.000 TL revize ödeneğin 2.472.381 TL’si harcanarak %52,57 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Büyük Onarımlar kapsamında; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, muhtelif birimlerde çeşitli onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; yapılması planlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı hazırlıkları için, “Adana BTÜ İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları (İltem) Statik-Betonarme-Mekanik ve Elektrik Tesisatları Projelerinin Hazırlanması işi” gerçekleştirilerek 128.620 TL harcanmış ve mevcut revize ödeneğin %25,72’si kullanılarak söz konusu ihtiyaç karşılanmıştır.

2015 yılı Yatırım Programına dâhil edilen Yayın Alımı Projesinde ise; 2015 yılı için ayrılan 500.000 TL ödeneğin %100’ü kullanılarak basılı yayın alımı ve abonelik ihtiyacımız karşılanarak kapasite artışı sağlanmıştır.

Üniversitemizin 2015 sonu itibariyle kütüphane kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

KAYNAK TÜRÜ	TOPLAM
BASIL KİTAP SAYISI	16.483
BASIL DERGİ SAYISI	12
ELEKTRONİK KİTAP SAYISI	215.000
ELEKTRONİK DERGİ SAYISI	66.563
ELEKTRONİK SESLİ KİTAP SAYISI	23.000
PDF ELEKTRONİK KİTAP SAYISI	3.000.000
VERİTABANI SAYISI	19

Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır.

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAĞI TÜRÜ	TOPLAM
BİLGİSAYAR SAYISI	398
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI	144
SERVER SAYISI	3
PROJEKSİYON SAYISI	14
AKILLI TAHTA SAYISI	29
VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SAYISI	0
FOTOKOPİ MAKİNESİ SAYISI	11
FAKS MAKİNESİ SAYISI	24
YAZICI SAYISI	212

Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir.

Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

TAŞIT TÜRÜ	ARAÇ TİPİ VEYA SINIFI	ARAÇ SAYISI
T2	BİNEK ARAÇ	3
T5	MİNİBÜS	2
T7	PİKAP 4X2	2
T8	PİKAP 4X4	1
T10	MİDİBÜS	1
T11.A	OTOBÜS	1
T11.B	OTOBÜS	1
T14	KAMYON (HİBE)	2
	İŞ MAKİNASI (TRAKTÖR)	1
	TOPLAM	14

d- 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 30.000.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. 2013 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen 11.898.000 TL ödenek ile 2014 yılı Yatırım programı kapsamında tahsis edilen 15.750.000 TL ödenek, o dönemde yerleşke arazisi tahsis çalışmalarının devam etmesi nedeniyle kullanılamamıştır. 2013 ve 2014 yılında kullanılamayan toplam 27.648.000 TL ödenek, 2015 yılı Yatırım Programı başlangıç ödeneği olan 30.000.000 TL'ye eklenerek toplam ödeneğimiz 57.648.000 TL'ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin araç alımı ihtiyacında kullanmak üzere Muhtelif İşler projesine toplam 203.000 TL likit ödenek eklenmiş, böylece Üniversitemizin 2015 yılı ödeneği toplam 57.851.000 TL olmuştur.

Ayrıca projelerin toplam bedeli, Muhtelif İşler ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine yapılan ödenek aktarmaları sonucunda 119.820.000 TL'den 120.423.000 TL'ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin 2015 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir.

2015 YILI SEKTÖREL OLARAK YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Revize Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Nakdi Gerç. (%)
Eğitim / Yüksek Öğretim	5	95.100.000	95.703.000	24.000.000	48.101.000	34.455.756	71,63%
Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor	1	12.000.000	12.000.000	2.500.000	3.250.000	0	0%
DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma	1	12.720.000	12.720.000	3.500.000	6.500.000	2.419.100	37,21%
TOPLAM	7	119.820.000	120.423.000	30.000.000	57.851.000	36.874.856	63,74%

Üniversitemizin proje bazında 2015 yılında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

2015 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
PROJE NO	PROJE ADI	2015 YILI ÖDENEĞİ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN HARCAMA	NAKDİ GERÇ. %
2015H030050	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	400.000	0	500.000	128.620	25,72%
2015H030060	Muhtelif İşler	4.500.000	203.000	0	4.703.000	2.472.381	52,57%
2015H030070	Yayın Alımı	500.000	0	0	500.000	500.000	100%
2013H031960	Kampüs Altyapısı	3.000.000	2.250.000	0	5.250.000	14.265.363	271,72%
2013H031970	Derslik ve Merkezi Birimler	15.900.000	21.248.000	0	37.148.000	17.089.392	46,00%
2013H050090	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.500.000	750.000	0	3.250.000	0	0%
2014K120120	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.500.000	3.500.000	500.000	6.500.000	2.419.100	37,21%
TOPLAM		30.000.000	28.351.000	500.000	57.851.000	36.874.856	63,74%

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir.

2015 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI						
TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN HARCAMA	NAKDİ GERÇ. %
39.05.09.01-09.8.8.00-2-06.1	3.500.000	0	500.000	3.000.000	2.419.100	80,63%
39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.1	578.000	203.000	0	781.000	780.309	99,91%
39.05.09.04-09.4.1.00-2-06.1	3.122.000	0	0	3.122.000	1.492.446	47,80%
39.05.09.06-08.2.0.00-2-06.1	500.000	0	0	500.000	500.000	100%
39.05.09.04-01.3.9.00-2-06.3	200.000	0	0	200.000	34.869	17,43%
39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5	19.000.000	23.898.000	0	42.898.000	31.483.375	73,39%
39.05.09.09-09.6.0.00-2-06.5	2.500.000	750.000	0	3.250.000	0	0%
39.05.09.09-09.8.8.00-2-06.5	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0%
39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7	600.000	0	0	600.000	164.757	27,45%
Toplam	30.000.000	28.351.000	500.000	57.851.000	36.874.856	63,74%

B- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

a- Devam Eden Projeler

1- Kamu Yatırım Projeleri

2015 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 projemizden Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Merkezi Araştırma Laboratuvarı projelerinde 2015 yılı içerisinde harcama gerçekleşmiş ancak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinde nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleştirme sağlanamamıştır.

Üniversitemizce 2015 yılı yatırım programında yer alıp devam etmekte olan projelerimizle ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz.

2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenmiştir. Projede, “Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi” birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır.

Kampüs Altyapısı Projesine, 2013 ve 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen ancak o dönemde arazi tahsis çalışmalarının devam etmesi sebebiyle kullanılmayan toplam 2.250.000 TL’nin, 2015 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000 TL’ye eklenmesiyle proje ödeneği 5.250.000 TL’ye ulaşmıştır. Proje bedeli 25.000.000 TL olan projede, inşaat sürecinin başlamasıyla 14.265.363 TL (12.089.290 TL + KDV) harcama yapılmış, ancak 2013, 2014 ve 2015 yıllarının toplam proje ödeneği olan mevcut 5.250.000 TL ödenek yeterli olmamıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olması ve inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu mevcut ödenekten fazla harcama yapılmıştır. Bu durum, 2016 yılı Yatırım Programındaki ödenek durumuna göre düzelecektir.

Proje kapsamında; 2015 Aralık sonu itibariyle yaklaşık 2.110 m tesisat galerisi, 4.620 m yağmur suyu hattı, 3.170 m atık su hattı ve çevre duvarının 10.700 m’lik kısmı tamamlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL olup, altyapı işleri bedeli ve iş artışı ile birlikte fiyat farkı hariç proje bazında yaklaşık olarak %35 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.


Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir.

2013H031960 Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri	
Proje No	2013H031960
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Sektörü	Eğitim / Yüksek Öğretim
Karakteristiği	KnI.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf
Proje Yeri	Adana
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2017
Proje Bedeli	25.000.000
2015 Yılı Ödeneği	3.000.000
Revize Ödenek	5.250.000
2015 Yılı Harcanan	14.265.363 TL (12.089.291 TL + KDV)
Nakdi Gerçekleşme*	271,72%
Fiziki Gerçekleşme*	35%

*Nakdi Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / 2015 Yılı Revize Ödenek

*Fiziki Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / İhale Bedeli

Kampüs uydu görüntüsü aşağıda gösterilmiştir.

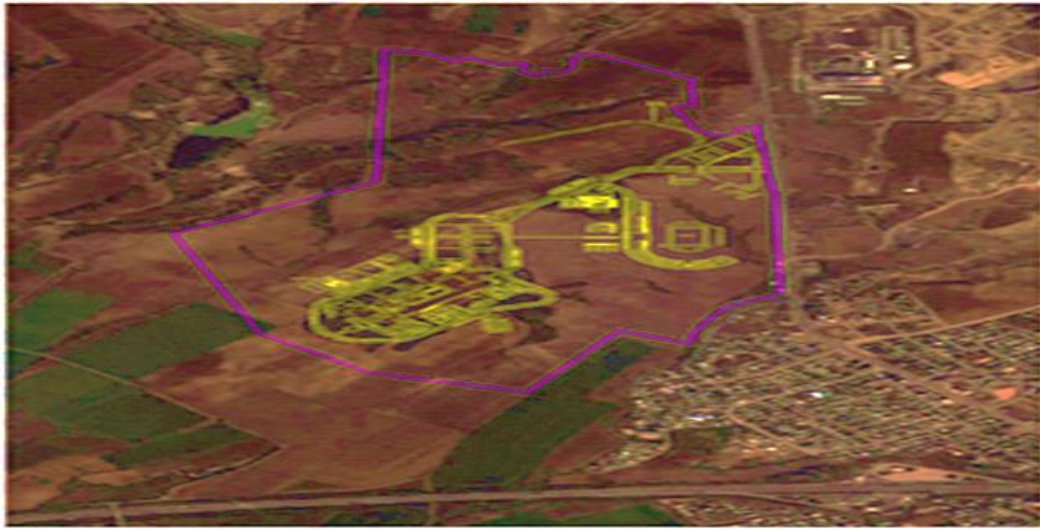

Devam eden inşaatlara ilişkin görüntü aşağıda gösterilmiştir.



2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenmiştir. Projede, “Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi” birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır.

Projede, 2013 ve 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen ancak o dönemde arazi tahsis çalışmalarının devam etmesi sebebiyle kullanılamayan 21.248.000 TL’nin eklenmesiyle proje ödeneği 37.148.000 TL’ye ulaşmıştır. 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen kalan 4.000.000 TL ödenek Üniversitemiz tarafından kullanılmak üzere likit olarak tutulmakta olup, 2016 yılında ilgili ödeneğin projeye aktarılması planlanmaktadır. İnşaat sürecinin başlamasıyla 17.089.392 TL (14.482.535 TL + KDV) harcama yapılmış olup, 2015 yılı mevcut revize ödeneğin %46’sı kullanılmıştır.

Proje; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binası olmak üzere toplamda 51.426 m² bina yapımını kapsamaktadır. İhalesi Kampüs altyapısı ile birlikte yapılan iki projenin ihale bedeli KDV hariç 73.370.000 TL olup, üç bina için toplamda yapılacak iş tutarına göre fiyat farkı hariç proje bazında yaklaşık %29 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilgili özet bilgi şu şekildedir.

2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri	
Proje No	2013H031970
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Sektörü	Eğitim / Yüksek Öğretim
Karakteristiği	İnş.+Don. Mer.Kaf.(11.608m2) Rek.Hiz.Bin.(16.252m2) Müh.ve Doğa Bil.1.Etap(23.566m2)
Proje Yeri	Adana
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2017
Proje Bedeli	65.000.000
2015 Yılı Ödeneği	15.900.000
Revize Ödenek	37.148.000
2015 Yılı Harcanan	17.089.392 (14.482.535 TL + KDV)
Nakdi Gerçekleşme*	46%
Fiziki Gerçekleşme*	29%

*Nakdi Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / 2015 Yılı Revize Ödenek

*Fiziki Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / İhale Bedeli

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binasını kapsamaktadır. Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı devam eden binaların proje ve inşaat çalışma örnekleri aşağıda yer almaktadır.



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları Projesi



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları İnşaatı



Rektörlük Binası Projesi



Rektörlük Binası İnşaatı



Merkezi Kafeterya Binası Projesi



Merkezi Kafeterya Binası İnşaatı

2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi


Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenmiştir.

Projede, 2013 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen ancak o dönemde arazi tahsis çalışmalarının devam etmesi sebebiyle kullanılamayan 750.000 TL'nin, 2015 yılı başlangıç ödeneği 2.500.000 TL'ye eklenmesiyle proje ödeneği 3.250.000 TL'ye ulaşmıştır. 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen 1.250.000 TL ödenek, Üniversitemiz tarafından kullanılmak üzere likit olarak tutulmakta olup, 2016 yılında ilgili ödeneğin projeye aktarılması planlanmaktadır.

Projede, 2015 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiştir. 6.500 m² olarak planlanan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatının 7.437 m² ve bitiş yılı 2016 olan projenin 2017 olarak revize edilmesi ilgili Kalkınma Bakanlığı'na talepte bulunulmuştur. Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinde, ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri	
Proje No	2013H050090
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Sektörü	Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor
Karakteristiği	İnş. (Spor Salonu (6500m ²) 1 Bas. Vol. S., 2 Tenis K., Müştemilat)
Proje Yeri	Adana
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2016
Proje Bedeli	12.000.000
2015 Yılı Ödeneği	2.500.000
Revize Ödenek	3.250.000
2015 Yılı Harcanan	0
Nakdi Gerçekleşme	0%
Fiziki Gerçekleşme	0%

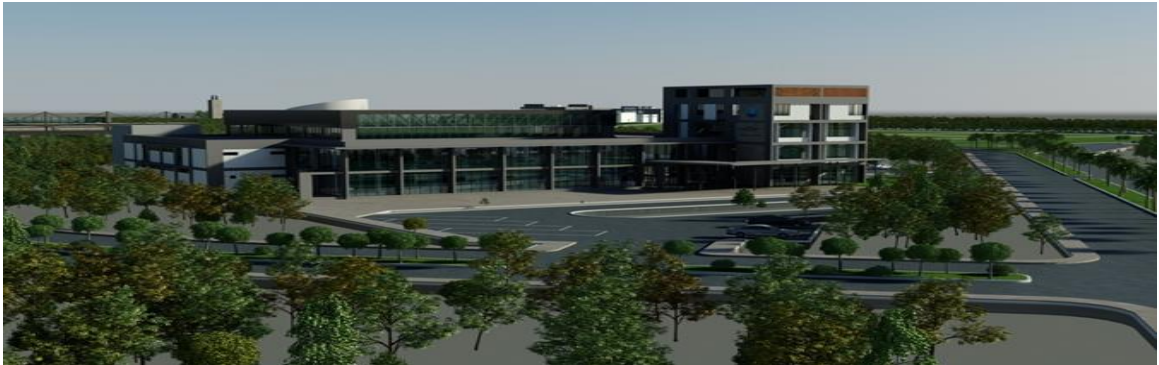

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

Projede, 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen ancak o dönemde arazi tahsis çalışmalarının devam etmesi sebebiyle kullanılmayan 3.000.000 TL'nin, 2015 yılı başlangıç ödeneği 3.500.000 TL'ye eklenmesiyle proje ödeneği 6.500.000 TL'ye ulaşmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış ve tamamlanmıştır.

İnşaat alt projesindeki 2.000 m² planlanan binanın yeterli olmaması sebebiyle, Kalkınma Bakanlığı'nın onayı ile bina inşaatı 2.827 m² ve inşaat işinin maliyeti 5.000.000 TL olarak revize edilmiştir. Bina inşaatı, yapımına başlanan binalar ile eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Projenin diğer alt kalemi olan Makine-Teknikat işinde laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL harcanmış, mevcut revize ödeneğin %37,21'i kullanılmıştır.

2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri	
Proje No	2014K120120
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Sektörü	DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma
Karakteristiği	İleri Araştırma, Mak-Tech., İnş. (2.827 m ²)
Proje Yeri	Adana
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2017
Proje Bedeli	12.720.000
2015 Yılı Ödeneği	3.500.000
Revize Ödenek	6.500.000
2015 Yılı Harcanan	2.419.100
Nakdi Gerçekleşme*	37,21%
Fiziki Gerçekleşme*	37,21%

*Nakdi Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / 2015 Yılı Revize Ödenek

*Fiziki Gerçekleşme : 2015 Yılı Harcanan / 2015 Yılı Revize Ödenek

b- Tamamlanan Projeler

1- Tamamlanan Projelerin Listesi

2015H030060 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesinde, geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım ve taşıt alımları hedeflenmiştir.

Projedeki 4.703.000 TL olan ödeneğin 2.472.381 TL harcanarak ödeneğin %52,57'si kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Proje No		2015H030060			
Proje Adı		Muhtelif İşler			
Başlama ve Bitiş Yılı		2015-2015			
Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerç. %
4.703.000	4.500.000	203.000	4.703.000	2.472.381	52,57%

2015H030060 proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde 2015 yılı için 4.500.000 TL ödenek mevcut iken, Üniversitemizin araç alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan toplam 203.000 TL likit ödeneğin eklenmesiyle birlikte proje bedeli ve ödeneği 4.703.000 TL olmuş, ödenekten 2.472.381 TL harcanarak projenin %52,57'si kullanılmıştır.

Proje kapsamında; Büyük Onarımlar alt projesine 600.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 164.757 TL'si harcanarak hizmet binalarında tadilat ve onarım işleri gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine 200.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 34.869 TL'si harcanarak Üniversitemizin bilgisayar yazılımı alımları gerçekleşmiş, Taşıt Alımı alt projesine 578.000 TL ödenek ayrılmış, 203.000 TL likit ödeneğin eklenmesiyle 781.000 TL olan ödeneğin 780.309 TL'si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine 3.122.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin 1.492.445 TL'si harcanarak büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir.

Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım-yazılım alımları ihtiyacı karşılanmıştır.

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030060					
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim /Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitemizin temel ihtiyaçları gidermek ve gelişimini sağlamak.					
Proje Yeri	Adana					
Karakteristiği	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil Don.Yz.Alt.Bak.On.Id.Yen.,Taşıt					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		4.500			4.703	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		2.472			2.472	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında Üniversitemizin gelişimine etki edecek mal (Otobüs, Minibüs, Binek Otomobil, Laboratuvar Cihazı, Büro ve Okul Mefruşatı...) ve hizmet (Bilgisayar Yazılımları) alımları yapılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizce projeden beklenen Büro, Okul ve Diğer Mefruşat, Büro Makineleri, Bilgisayar, Laboratuvar Cihazı, Diğer Makine Teçhizat, Taşıt ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının sağlanmasıyla birlikte Üniversitemiz ülkemize katma değer, istihdam artışı, bölgesel ve ulusal kalkınma ve zaman tasarrufu gibi faydalar elde etmiştir. Ayrıca evrensel bilime de katkı sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje, kurulmakta olan üniversitemizin yapacağı eğitim hizmetlerini yerine getirebilmesi için büyük önem taşıyan temel gereksinimlerin karşılanması ve uygun altyapının oluşturulması konularında katkı sağlamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Proje kapsamında Üniversitemiz Büro Mefruşatı Alımları, Okul Mefruşatı, Diğer Mefruşat Alımları, Büro Makineleri Alımları, Bilgisayar Alımları, Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları, Kara Taşıt Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları işleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2015H030050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenmiştir.

Projede, 2013 yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen ancak o dönemde arazi tahsis çalışmalarının devam etmesi sebebiyle kullanılamayan 400.000 TL’nin, 2015 yılı başlangıç ödeneği 100.000 TL’ye eklenmesiyle proje ödeneği ve bedeli 500.000 TL’ye ulaşmıştır. Proje kapsamında; Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış, «Adana Btü İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları (İltem) Statik-Betonarme-Mekanik ve Elektrik Tesisatları Projelerinin Hazırlanması İş» işi tamamlanarak 128.620 TL harcanmış ve ödeneğin %25,72’si kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.

Proje No	2015H030050				
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi				
Başlama ve Bitiş Yılı	2015-2015				
Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerç.%
500.000	100.000	400.000	500.000	128.620	25,72%

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030050					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması					
Proje Yeri	Adana					
Karakteristiği	Etüt - Proje ve Muş.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		129			129	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin tamamlanmasıyla yapılması planlanan binanın etüt - projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhtiyaç duyulan statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri hizmeti karşılanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2015H030070 Yayın Alımı

Eğitim-öğretim araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için basılı ortamda ve elektronik ortamda kitap, dergi, gazete ve diğer materyallerin alımı ve abone olunmasını hedef alan projede, 2015 yılı Yatırım Programı kapsamında 500.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Proje kapsamında; basılı yayın alımı ve elektronik kaynak aboneliği gerçekleştirilerek 500.000 TL harcanmış olup, ödeneğin %100'ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır.

Proje No	2015H030070				
Proje Adı	Yayın Alımı				
Başlama ve Bitiş Yılı	2015-2015				
Proje Bedeli	2015 Yılı Ödeneği	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerç.%
500.000	500.000	0	500.000	500.000	100%

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030070					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Yerleşke kütüphanelerin kurulması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun hizmet ve koşulların sağlanabilmesi.					
Proje Yeri	Adana					
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi	Öğrenci, akademik ve idari personel					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		500			500	
Yıllar itibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla		2015 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)		500			500	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Kütüphanenin kuruluş ve hizmete açılış aşamasında sorun teşkil edecek unsurlar görülmemiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ

“Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir.” misyonumuz ve “Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır.” vizyonumuz doğrultusunda, üniversitemizin fiziki gelişimini sağlayabilmesi için yatırımlar büyük önem arz etmektedir.

Şehrin değişik yerlerinde dağınık halde bulunan kiralık binalarda öğrencilerimize eğitim vermeye çalışılmaktadır. Yeni açılan bölümlerle birlikte Üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmış olup, öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak akademik ve idari personel sayısı da artmıştır. Öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortamda eğitim verilmesi için yapımı devam eden kampüs inşaatının bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 2015 yılında Üniversitemizin sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerin büyük bir kısmı kampüs inşaatının tamamlanması için harcanmıştır. Bu amaç için ayrılan ödenğin arttırılması durumunda kampüs inşaatı hızla tamamlanacaktır.

2015 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin tamamlanması için gerekli bina için mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış olup, inşaaata henüz başlanmamıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının bazı laboratuvar cihazları satın alınması yapılmıştır.

Üniversitemizin kendine ait taşıt sayısının az olması nedeniyle söz konusu ihtiyaç kiralama yoluyla giderilmektedir. Bu yöntem bütçede taşıt kiralama için ayrılan giderlerin artmasına neden olmaktadır. 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıtlar satın alınarak Üniversitemize mal edilmiştir. Kiralama giderlerinden tasarruf edilebilmesi, ileriye yönelik olarak taşıt sayısının arttırılabilmesi ve ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre çeşitlendirilebilmesi için, bu amaç için konulan ödeneklerin arttırılması ve Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıt sayının arttırılması gerekmektedir.

2015 yılında Üniversitemiz kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için kitap, dergi vb. gibi basılı yayın alımları ile elektronik ortamda yayın alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz eğitim-öğretiminde önemli bir yeri olan kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşidinin çoğaltılması için Üniversitemize ayrılan yayın alımları ile ilgili ödeneklerin arttırılması yararlı olacaktır.

D- EKLER

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		107.703						26.500			51.351			34.455
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		12.720						3.500			6.500			2.419
TOPLAM	7		120.423						30.000			57.851			36.874

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
